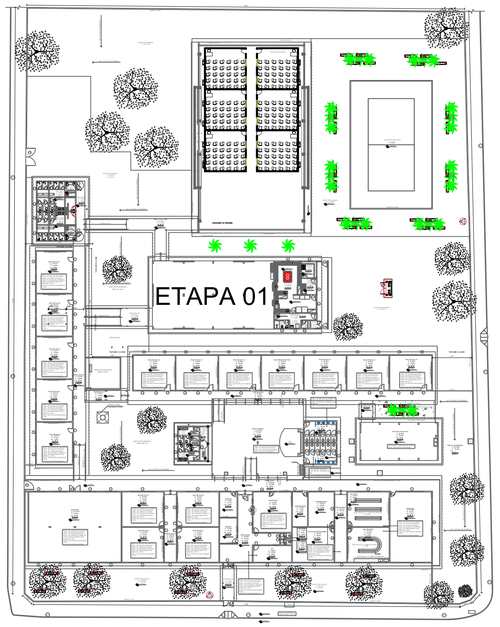

PLANTA ETAPA 01
ESCALA: 1:1/500

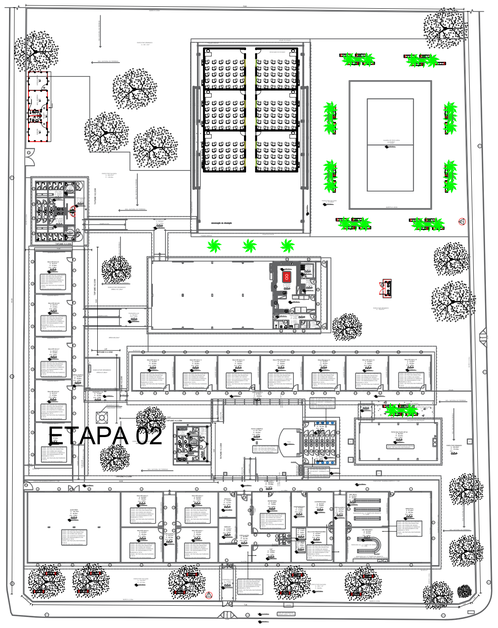

PLANTA ETAPA 02
ESCALA: 1:1/500

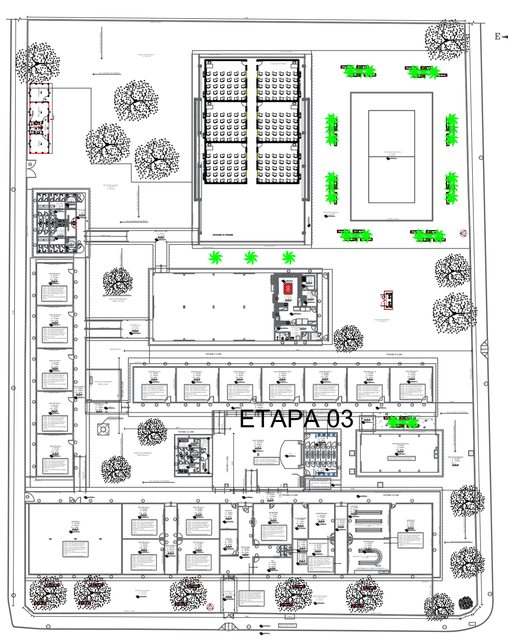

PLANTA ETAPA 03
ESCALA: 1:1/500

QUADRO RESUMO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	
	DESCRIÇÃO
26	CANTEIRO DE OBRAS: - EXECUÇÃO DE LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO COM COMPACTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO BARRACÃO - IMPLANTAR BARRACAO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA - EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE (H=2.20M), COM REAPROVEITAMENTO SALAS DE GESSO ACARTONADO: - EXECUTAR PAREDE EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA ESMALTE NO BARRADO H=150CM (INTERNO E EXTERNO) E PINTURA ACRILICA ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO); - EXECUTAR RODAPÉ DE POLIESTIRENO H=5CM (INTERNO E EXTERNO); - EXECUTAR FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO E PINTURA; - EXECUTAR PINTURA DO PISO DA QUADRA; - INSTALAR PORTA DE MADEIRA E JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM; - INSTALAR QUADRO ESCOLAR MISTO NAS SALAS DE AULA; - EXECUTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VER PROJETO; - EXECUTAR O DRENO DO AR CONDICIONADO;

ETAPA 01:
- SERÁ FEITO A CONSTRUÇÃO DAS SALAS EM GESSO ACARTONADO PARA REMANEJAR OS ALUNOS COM AS ETAPAS DAS OBRAS E NÃO ATRAPALHAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR; IMPLANTAÇÃO DO BLOCO DE BARRACÃO, DEMOLIÇÃO DOS BLOCOS PROPOSTOS E CONSTRUÇÃO DOS NOVOS BLOCOS PROPOSTO;

ETAPA 02:
- SERÁ FEITO A REFORMA DO BLOCO PROPOSTO COM TROCA DE TELHAS, FORROS E AS ADEQUAÇÕES FEITAS PARA REFORMA E A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DOS BANHEIROS;

ETAPA 03:
- SERÁ FEITO A REFORMA DE ALGUNS BLOCOS COMO OS BANHEIROS, SALAS DE AULA, DOS PÁTIOS CORERTOS, REMANEJANDO OS ALUNOS PARA AS SALAS PROVISORIAS NA QUADRA COBERTA;

ETAPA 04:
- SERÁ FEITO A REFORMA DA PARTE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE, LABORATORIOS, REMANEJANDO ESTES AMBIENTES PARA AS SALAS PROVISORIAS NA QUADRA COBERTA E NO FINAL DA OBRA RETIRAR AS SALAS DE GESSO E FAZER A REFORMA DA QUADRA;

OBS.:
- As etapas / divisões propostas para a obra são uma sugestão da Arquiteta, no qual, as mesmas poderão sofrer alterações conforme o fiscal perceba a necessidade, visto que é de plena responsabilidade do fiscal a conduçãoda obra. Caso necessário, a Arquiteta poderá ser consultada;
- Os tapumes de madeirite deverão ser reaproveitados nas etapas da obra;
- Vale ressaltar ainda que, foram definidas etapas de obra para as ampliações mais significativas, contudo, há ainda outras intervenções, as quais, ficará a critério do fiscal da obra definir em qual momento as mesmas deverão ser executadas.

OBS:
- Em cada etapa quando for executar a pintura dos blocos ver a possibilidade de fazer a pintura de ambiente por ambiente para não prejudicar o andamento da unidade escolar.

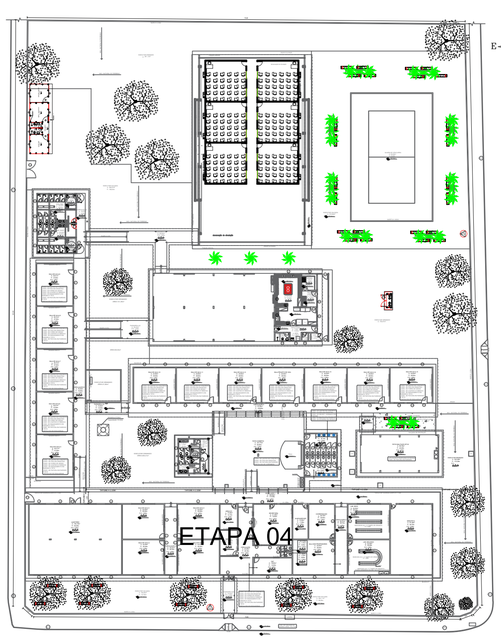

PLANTA ETAPA 04
ESCALA: 1:1/500

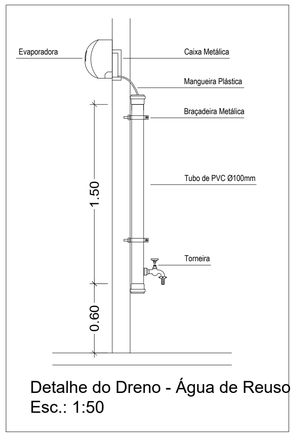

Detalhe do Dreno - Água de Reuso
Esc.: 1:50

QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS				
REFORMA E AMPLIAÇÃO				
DESCRIÇÃO DO BLOCO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
CANTEIRO DE OBRAS	EXECUÇÃO	LIMPEZA	M2	94,38
		REGULARIZAÇÃO	M2	94,38
		APILOAMENTO	M2	94,38
		BARRACÃO D EOBRAS	UND	1,00
		TAPUME DE MADEIRITE (ALTURA 2,20M)	M2	267,00
SALAS DE GESSO	EXECUÇÃO	PINTURA DO PISO DA QUADRA	M2	614,27
		PAREDE DE GESSO ACARTONADO	M2	356,00
		RODAPÉ DE POLIESTIRENO H=5CM (INTERNO E EXTERNO)	M	282,40
		FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	294,00
		ACABAMENTO PARA FORRO	M	168,00
		PINTURA	M2	294,00
		EMASSAMENTO	M2	294,00
		PINTURA ACRÍLICA ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO)	M2	282,40
		EMASSAMENTO	M2	282,40
		PINTURA ESMALTE DO BARRADO H=150CM (INTERNO E EXTERNO)	M2	423,60
		EMASSAMENTO	M2	423,60
		ESQUADRIAS		
		PORTA DE MADEIRA 80X210CM	UN	6,00
		JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 06 UN	M2	12,00
		QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRÃO SEDUC	UN	6,00
COMPLEMENTARES		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VER PROJETO	
		INSTALAÇÃO DO DRENO DO AR CONDICIONADO	VER DETALHE	

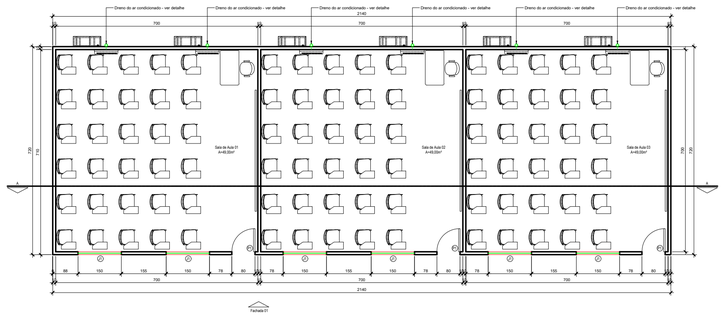





QUADRO DE ABERTURAS		
ESQUADRIAS	DIMENSÕES (CM)	ESPECIFICAÇÃO
PORTAS		
P1	80 X 210	ABRIR - MADEIRA
JANELAS		
J1	150 X 100 X 110	2 FOLHAS - CORRER - VIDRO TEMPERADO 8MM

PAS
www.pasnet.com.br

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI CRUZEIRO DO SUL

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO: AV. DAS ROSAS QD. 03 S/N, CRUZEIRO DO SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL À CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01	VIDE ARQ. 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA-SP: 5062414910

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: JÉSSICA ALVES BUENO SOUSA CPF: 033.178.021-62

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE EXECUÇÃO Esc.: 1/

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
NOVEMBRO/2022	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

FOLHA:
